

第 2 期処理施設プラズマ溶融分解設備 2 号機設置工事の 進捗状況について

第 2 期処理施設のプラズマ溶融分解設備 2 号機の設置工事は、平成 22 年 4 月 12 日に着工して以来、これまでに事故、トラブル等もなく順調に工事を進めています。



平成 22 年 4 月 12 日 着工

杭工事開始



平成 22 年 5 月

掘削工事開始



平成 22 年 7 月

鉄骨工事開始



平成 22 年 8 月

機器据付工事開始

(主要な機器)

- ・プラズマ溶融分解炉
 - ・恒温チャンバ
 - ・減温塔
 - ・No.1 バグフィルタ
 - ・No.1、2 触媒反応塔
- (別添、写真参照)



平成 22 年 9 月

鉄骨工事完了



平成 22 年 10 月

配管・電気工事開始



平成 22 年 11 月

外装 ALC 工事開始



平成 22 年 12 月

外装 ALC 工事完了



平成 23 年 1 月

外壁塗装工事完了
屋根工事完了

今後の主なスケジュール

- ・平成 23 年 7 月末 機器据付工事及び機器調整完了予定
- ・平成 23 年 8 月～ 12 月 試運転予定
- ・平成 24 年 1 月 操業開始予定



(プラズマ 2 号機建設工事スケジュール表)

	平成 22 年												平成 23 年												平成 24 年					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
建設工事				建設工事着工 4/12									H23 2/1 現在																	
機器据付工事																														
外構工事																														
機器調整																														
試運転																														

試運転開始予定 (H23.8)

操業開始予定 (H24.1)

主要な機器の据付状況写真

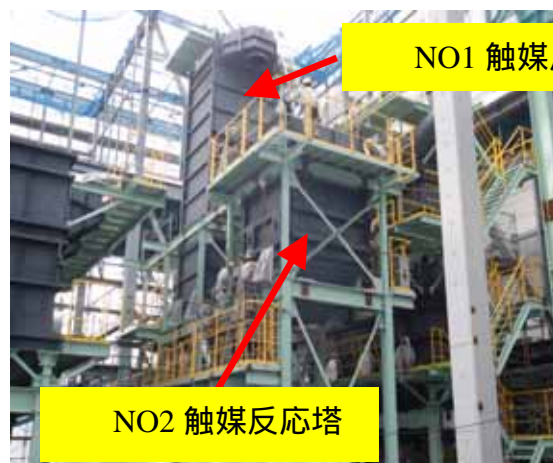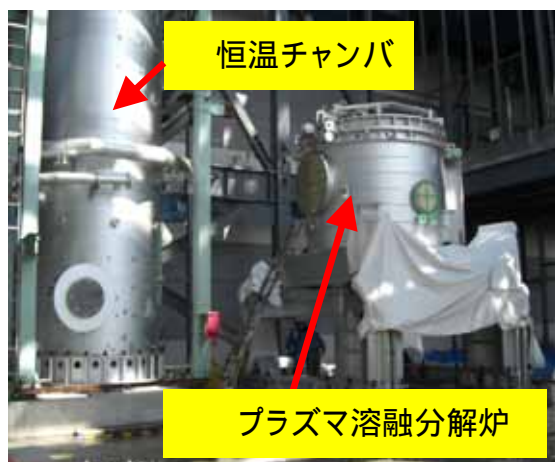

主要な機器のフロー図

