

第1期施設解体撤去・先行工事の 実施状況について

北九州PCB処理事業所

解体撤去の基本方針

周辺環境への配慮

作業者の安全衛生管理

PCB廃棄物の無害化处理


先行工事の実施状況について

前回ご提示したスケジュールのうち、GB本体と粗解体設備の解体工事については、新型コロナウイルス感染症の影響で十分な化学防護服が確保できず着手できませんでしたが、工事着手の目途が立ちました。


	令和元年度	令和 2 年度				令和 3 年度
		4 月～ 6 月	7 月～ 9 月	10 月～ 12 月	1 月～ 3 月	
先行工事 (全体)						
GB 本体						
粗解体設備						
破碎分別設備						
VTR 等設備						

※破碎分別室と VTR 等設備は、化学防護服の確保状況等により来年度までかかる可能性があります。

先行工事

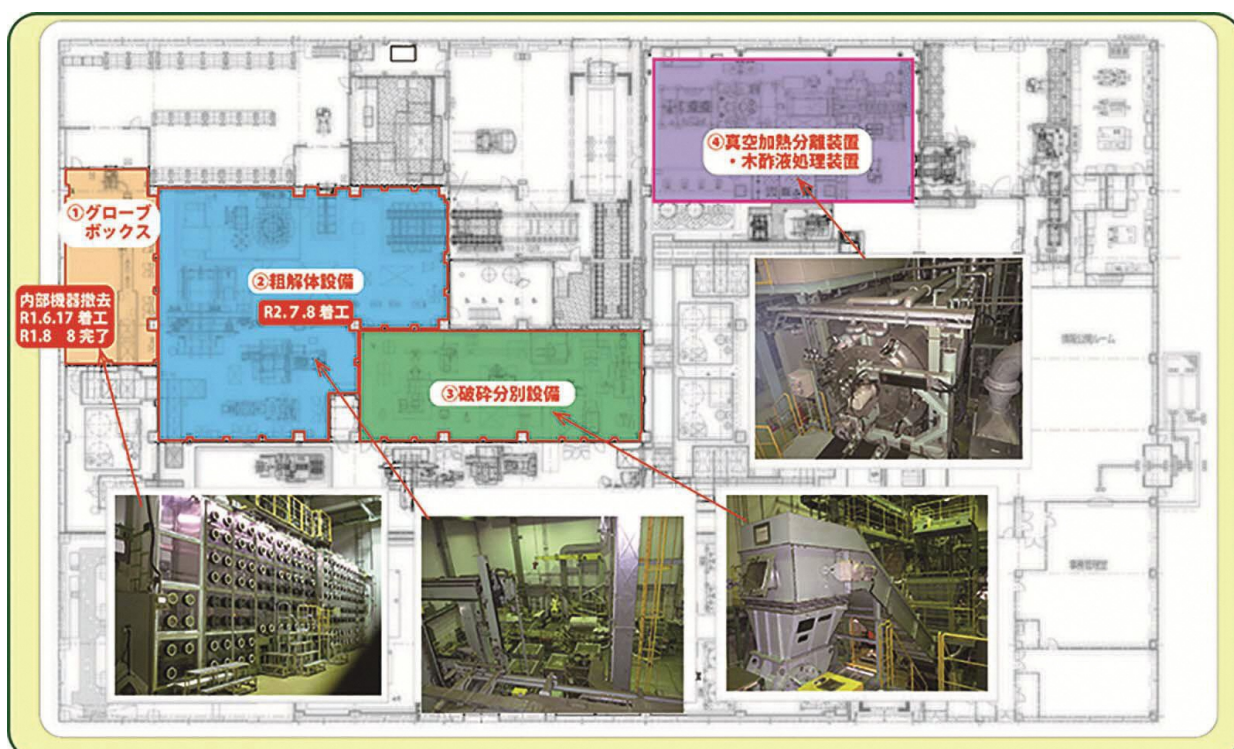


グローブボックス本体等の解体撤去工事

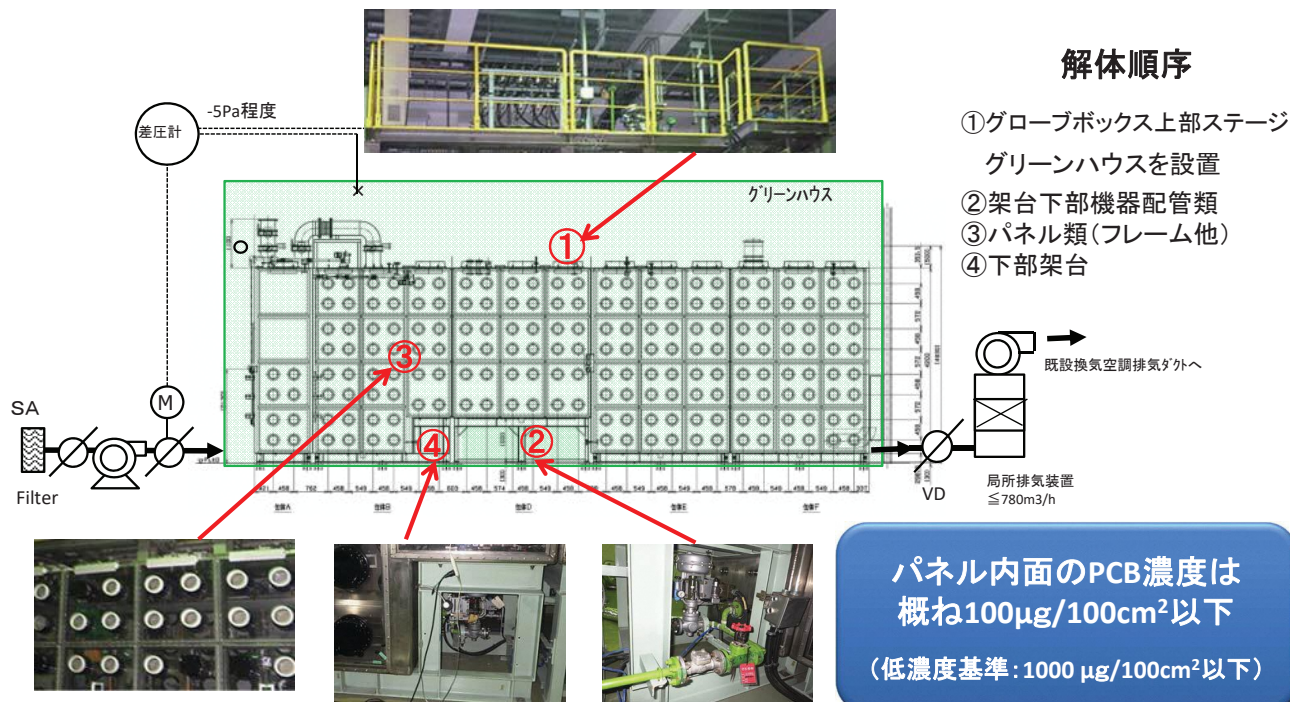

粗解体設備の解体撤去工事

～2020年7月8日着工 作業エリアを確保しながら順次解体～

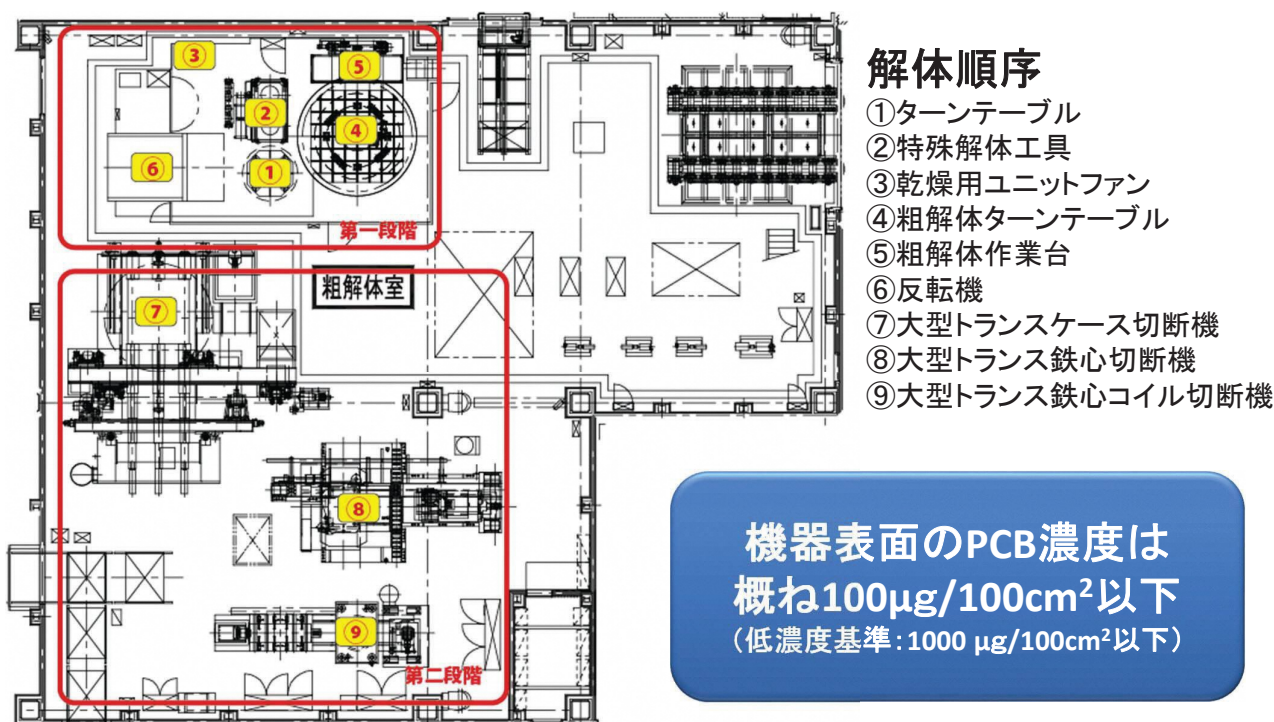

情報公開

～粗解体现場のWEBカメラを新設・事業だより～



3画面表示



粗解体装置にしたカメラを全画面表示



クリック

事業だより

情報公開ルームで解体撤去状況を確認できるように設置しているカメラを、グローブボックスに1台、粗解体室に1台追加しました。今後も、解体撤去の進捗に合わせて、カメラを増設していきます。
